

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 27 del mes de Junio de 2016, reunidos los representantes del,

**H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.**

**C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramón**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: C. GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ.

Domicilio: AV HIDALGO NO. 18, COL. CENTRO, CHOCAMAN, VER.

RFC: LORG800514DS4

Representante Legal: C. GUSTAVO LOPEZ RAMIREZ.

Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra:

**"REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDA ABASOLO ESQUINA CALLE MORELOS".**

**DATOS DE LA OBRA:**

Fondo: No. De Obra: **2016300620101** No. De Contrato: **FORTAMUNDF/2016/0101** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa (X) Invitación a tres contratistas ( ) licitación Pública ( )

Monto del contrato: **\$285,359.07**

Fecha de Inicio: **02 MAYO 2016**

Fecha de Término: **25 JUNIO 2016**

**INVERSION:**

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL	FISMDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$285,359.07	0.00	\$285,359.07	\$285,359.07	0.00	\$285,359.07



*Alfonso de la Cruz*

*Arce*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**



Descripción		
<b>"REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDA ABASOLO ESQUINA CALLE MORELOS "</b>		
<b>PRELIMINARES</b>		
	TRAZO EN TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES	M2
	CORTE CON DISCO DE 6.35CM DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML
	DEMOLICIÓN DE PISO O BANQUETA A MANO DE CONCRETO REFORZADO DE 8 A 10CM DE ESPESOR, INCLUYE APILE DE MATERIAL.	M2
	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO, TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00MTS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3
	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO (ARENA) EN CAPAS DE 20 CM COMPACTADO AL 90% PROCTOR, , INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO	M3
	ACARREO EN CAMION PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA MANUAL	M3
	PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4".	M2
	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2
	ELABORACION DE CHAFLAN PARA CUBRIR MANGUERA DE HIDROTOMAS EXPUESTAS SOBRE CALLE MORELOS	ML
<b>ALUMBRADO</b>		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FoGo DE 1 1/2" CED. 40 CON COPLE EN EL EXTREMO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO DE 1 1/4" CED 40CON GUIA, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML

**SINDICATURA**  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO**  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERÍA**  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS







*[Handwritten signatures and stamps]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

 SECRETARÍA AYUNTAMIENTO CHOCAMÁN, VER. 2014-2017       PRESIDENCIA MUNICIPAL CHOCAMÁN, VER. 2014-2017     OBRAS PÚBLICAS CHOCAMÁN, VER. 2014-2017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTROS PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 33 X 33 X 40 CM PREFABRICADO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO. INCLUYE EXCAVACION, NIVELACION Y CIMENTACION	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO RECTANGULAR DE 40 X 40 X 60 CON ANCLA GALVANIZADA, INCLUYE MATERIAL, EXCAVACION, NIVELACION Y CIMENTACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 4" CED. 30 DE 7 MTS DE ALTURA PARA LUMINARIA TIPO RECTO CIRCULAR. INCLUYE: BRAZO METALICO DE 1.20 ML CON ARREGLO EN SOLERA, PLACA INFERIOR DE 30X30 CMS., DE 1/2" DE GRUESO; CARTABON DE 3" X 1/4" DE 15 CMS., DE ALTURA. PRIMARIO Y PINTURA VERDE BOSQUE	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO METALICO PARA LUMINARIA DE 1.5 PLG. CED. 30 Y 1.20 M DE LONGITUD CON ARREGLO INFERIOR EN SOLERA, PARA COLOCAR EN POSTE DE CONCRETO PROPIEDAD DE CFE. INCLUYE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE VERDE BOSQUE.	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA MONTAJE EN POSTE CON BRAZO TECNOLOGIA LED DE 100 W, INCLUYE: SISTEMA DE FOTOCELDA. MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE XLP 1+1 CAL. 4 TIPO SUBTERRANEO	ML
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR THW CAL. 10 PARA ALIMENTACION DE LUMINARIA. INCLUYE CONECTORES UDC PARA CONEXION CABLE ALUMINIO Y COBRE	ML
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA 1K PARA LUMINARIA, INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 1 MT, CONECTOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA, INCLUYE BAJANTE CON TUBO GALVANIZADO E ITM 2 X 15 AMPS. CON GABINETE, COLOCADO EN POSTE DE CONCRETO	PZA
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>	\$245,999.20
	<b>Impuesto</b>	\$39,359.87
	<b>Total</b>	\$285,359.07



**SINDICATURA**  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

*[Handwritten signature]*



**TESORERÍA**  
CHOCAMÁN, VER.  
2014-2017

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y apta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar oportunamente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas. Del día citado, 2014-2017

Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

**EL COMITÉ COMUNITARIO:**

Presidente: [Signature]

Suplente: [Signature]


Secretario: [Signature]

Suplente: Antonio Serrano Rivera

Vocal: Javier Pérez Arce

Suplente: Modesto Hernández

El acto de **ENTREGA-RECEPCION** de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos

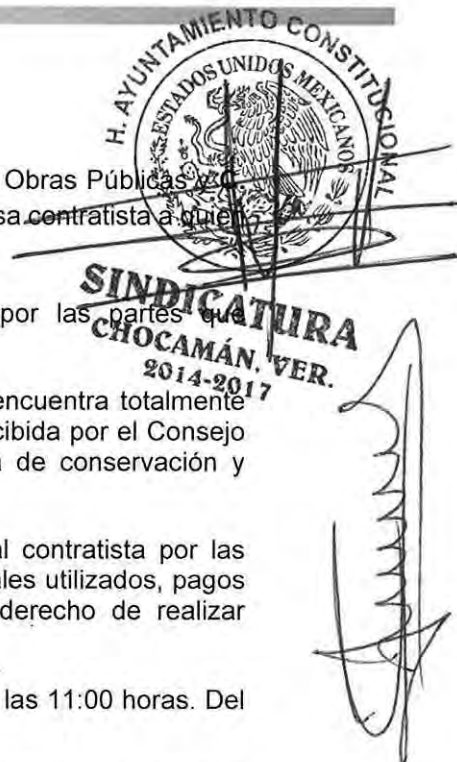

[Signature]



[Signature]





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

Damos fé

Por el H. Ayuntamiento

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL

SINDICO UNICO

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramírez

C. Octavio Hernández

TESORERO

SECRETARIO

C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

TESORERIA CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO CHOCAMÁN, VER. 2014-2017

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN

Presidente:

Suplente:

Secretario:

Suplente:

Vocal

Suplente:
