

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021
 CHOCAMAN VERACRUZ
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS



Un gobierno
 progresista que
 está contigo

CHOCAMÁN
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

OFIC/PRESID/109/19
 CHOCAMÁN, VER. A 10 DE JULIO DE 2019

C.P. LORENZO ANTONIO PORTILLA VAZQUEZ
 AUDITOR GENERAL DEL ORGANO DE FISCALIZACION
 SUPERIOR DEL ESTADO
 CD. XALAPA, VERACRUZ-LLAVE

P R E S E N T E:

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO EL REPORTE MENSUAL DE OBRAS PÚBLICAS, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMÁN, VERACRUZ; EN RELACIÓN AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

SIN OTRO PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED AGRADECIENDO LA ATENCIÓN PRESTADA, Y QUEDO COMO SU ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.


ATENTAMENTE:

"UN GOBIERNO PROGRESISTA QUE ESTÁ CONTIGO"

C. NORMA LIDIA ROJAS TREJO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.



PRESIDENCIA
 CHOCAMÁN, VER.
 2018-2021



Anexo al oficio No. EMO/2019/CHOCAMÁN/49512

Numero Obra	Descripción	Formato 09H	Formato 09V	Formato 1I	Formato 1Z
2019300620114	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO	No	No	No	No
2019300620118	REHABILITACIÓN DE PARQUE JUAN FELIX LUNA	SI	No	SI	No
2019300620119	MEJORAMIENTO URBANO DEL CENTRO DE CHOCAMÁN	No	No	No	No

EMO/2019/CHOCAMÁN/49512



ORFIS
PUBLICOS
CHOCAMÁN
 2018-2021

SELO DIGITAL:

eA8R6S9Tdf6dWx7f0He/1D0ueCUNvEove15N/v6INB9ckOJ/wKakI07OJ4us1HwV2D+EVH/rf5ne7+RT3PadiLw7M8M7WchLIRG60986SEaT7wkcYsCP6DYF69VE4TTeoIQ7wvZmhW5nd7FW/2IIfdmkF28EicVU6FBH9sEn=



H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

EJERCICIO 2019

FECHA DE ELABORACION:
21/05/2019
MES QUE SE REPORTA:
JUNIO

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: CHOCAMAN LOCALIDAD: CHOCAMAN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN-DE No. DE OBRA: 2019300620118 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE JUAN FELIX LUNA

CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO: SI NO ANTECEDENTES: SI NO X

TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FISM-DF: CLAVE N/A
ZONA: URBANA AGE: SI NO X
SE ENCUENTRA EN UNA ZAP: SI NO X
SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO: SI NO X

COORDENADAS DE GEORREFERENCIA: LONGITUD 0.000000000 LATITUD 0.000000000

GRADO DE REZAGO SOCIAL: NIJY ALTO MEDIO BAJO X NIJY BAJO
TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO: DIRECTA INDIRECTA COMPLEMENTARIA
PROYECTO ESPECIAL CUENTA CON OPIÓN FAVORABLE SI NO X

ESTADO FINANCIERO DE OBRA*

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		ESTADO FINANCIERO DE OBRA*		FACTURAS																		
		No.	MONTO	No.	MONTO	IMPORTE OBRA EST.	AMORTIZADO	5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	IMPORTE DEVENGADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	\$1,473,066.86	190400	\$1,708,758.60	A496	\$1,708,758.60	\$512,627.58	\$7,365.34	\$0.00	\$1,188,765.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 FINQUITO	\$637,009.64	190800	\$637,009.64	516	\$637,009.64	\$191,102.89	\$2,745.73	\$0.00	\$443,161.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	\$2,110,076.50		\$2,345,768.24		\$2,345,768.24	\$703,730.47	\$10,111.07	\$0.00	\$1,631,926.70															

REPORTES		AVANCE FISICO REAL													
MONTO PAGADO EN EL MES:	EXISTE	FECHAS	AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC
\$636,009.64		10/06/2019	PROGRAMADO	0	0	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$2,345,768.24	10/06/2019	REAL	0	0	33	57	28	0	0	0	0	0	0	0
FINQUITO:	\$637,009.64	10/06/2019	ACUMULADO	0	0	35	72	72	100	0	0	0	0	0	0
ACTA ENTREGA RECEPCION:	X	15/05/2019	ATRASSO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LA OBRA AL MOMENTO CUENTA CON UN 100% DE AVANCE FISICO

*En caso de requerir más filas en el apartado de estado financiero utilizar otra hoja.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:
REHABILITACION DE PARQUE JUAN FELIX LUNA (PRIMERA ETAPA)

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:
100% DE AVANCE FISICO DE LA OBRA

MONTO AUTORIZADO: \$2,345,768.24 C/VA
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE: \$2,326,741.21 NO APLICA X
VALIDACIÓN DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE X
DEPENDENCIA QUE VALIDA: NO EXISTE NO EXISTE X
FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: EXISTE NO EXISTE X
DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD: NO APLICA X

TIPO DE LICITACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA EXISTE
INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS X
LICITACIÓN PÚBLICA X

NO. DE CONTRATO: 2019300620118-00 FECHA: 01/03/2019
CONTRATISTA: HUATUSCO CONSTRUCTIVE S DE RL DE CV.
MONTO CONTRATADO: \$2,345,768.24 PROGRAMADA REAL C/VA

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 01/03/2019 01/03/2019
TERMINO 31/12/2019 15/05/2019
DÍAS 0 76

ANTICIPA: APLICA X NO APLICA
FECHA DE PAGO: \$703,730.47 PORCENTAJE: 30.00 04/04/2019

TIPO DE FINANZAMIENTO: ANTIPO
MONTO FINANZADO: \$703,730.47 CUMPLIMIENTO \$202,221.40 VICIOS OCULTOS \$234,576.82
MONTO ATRIBUIBLE: \$198,641.9 DIFEREN ASSEGUADORA DIFEREN ASSEGUADORA DIFEREN ASSEGUADORA DIFEREN ASSEGUADORA
NO. DE FINANZAS: 1986419 1986419 1986419 1986419
FECHAN. INICIAL: 01/03/2019 01/03/2019 15/05/2019
FECHA FINAL: 01/03/2019 15/05/2019

CONVENIO: NO APLICA
MONTOS: MONTO EXISTE IMPORTE/PERIODO INICIAL FINAL
PLAZO: NO APLICA
C/VA



Arq. Luis Alberto Hilberta Cabrera
SUPERVISOR
FORMATO 11

OPORTUNIDAD
PUBLICIDAD
CHOCAMAN
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMÁN, VER.

FORMATO 09

REPORTE FOTOGRAFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DAIOS GENERALES


Municipio: CHOCAMÁN Localidad: CHOCAMÁN
 No. de obra: 2019300620118 Período: JUNIO
 Descripción: REHABILITACIÓN DE PARQUE JUAN FELIX LUNA
 Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019
 Número de estimación: 2 FINIQUITO
 Fuente de financiamiento: FORTAMUN-DF
 Fecha de revisión: 09/07/2019



FOTO

Concepto de obra ejecutado: Piso de recinto negro volcánico en placas de 2 cm de espesor, sobre firme de concreto asentado con mezcla de cemento, arena proporción 1:4, Incluye, suministro, cortes con disco de diamante, desperdicios, materiales,


Concepto de obra ejecutado:

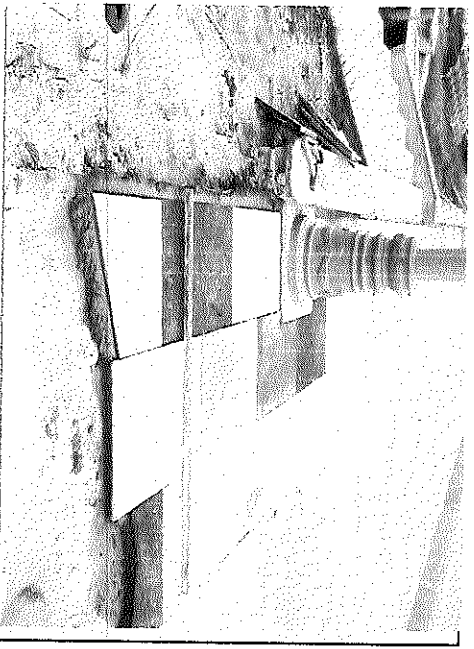

FOTO

Piso de recinto negro volcánico en placas de 2 cm de espesor, sobre firme de concreto asentado con mezcla de cemento, arena proporción 1:4, Incluye, suministro, cortes con disco de diamante, desperdicios, materiales,

Observaciones:



OPRIS

PUBLICIS

CHOCAMÁN 2018-2021

LUIS ALBERTO HUERTA CABRERA
 ARQUITECTO
 Supervisor responsable
 c.c.p. Presidente Municipal
 c.c.p. Contralor Interno
 c.c.p. Tesorero Municipal
 c.c.p. Director de Obras Públicas
 c.c.p. Ofis
