

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021  
 CHOCAMAN VERACRUZ  
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS



Un gobierno  
 progresista que  
 está contigo

**CHOCAMÁN**  
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

OFIC/PRESID/109/19  
 CHOCAMÁN, VER. A 10 DE JULIO DE 2019

C.P. LORENZO ANTONIO PORTILLA VAZQUEZ  
 AUDITOR GENERAL DEL ORGANO DE FISCALIZACION  
 SUPERIOR DEL ESTADO  
 CD. XALAPA, VERACRUZ-LLAVE

**P R E S E N T E:**

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO EL REPORTE MENSUAL DE OBRAS PÚBLICAS, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMÁN, VERACRUZ; EN RELACIÓN AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

SIN OTRO PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED AGRADECIENDO LA ATENCIÓN PRESTADA, Y QUEDO COMO SU ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.


ATENTAMENTE:

*"UN GOBIERNO PROGRESISTA QUE ESTÁ CONTIGO"*

C. NORMA LIDIA ROJÁS TREJO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.



PRESIDENCIA  
 CHOCAMÁN, VER.  
 2018-2021



Anexo al oficio No. EMO/2019/CHOCAMÁN/49513

Número Obra	Descripción	Formato 091H	Formato 09V	Formato 11	Formato 12
2019300620201	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PASO CANOAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE	No	No	No	No
2019300620202	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOCALIDAD TETLA	No	No	No	No
2019300620203	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AV, AVILA CAMACHO ENTRE AV. 1 JUAN FELIX LUNA	No	No	No	No
2019300620204	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COLONIA ANALCO, DE LA CABECERA	No	No	No	No
2019300620205	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TETLA - CHOCAMAN, VER	No	No	No	No
2019300620206	REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE NERIA KM 0+000.00 AL 0+977.00	No	No	SI	No
2019300620207	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO EN PROLONGACIÓN DE CALLE LA ESPERANZA, DE LA LOC. DE SAN JOSÉ NERIA	No	No	No	No
2019300620208	REHABILITACIÓN DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOC. TETLA	SI	No	SI	No



**OBRAS**

**PUBLICAS**

**CHOCAMÁN**

2019-2024

SELLO DIGITAL:

Dn:3t0BwwGtd+nAZ7chcr/hn03FEWpwwerdnXw94dcgdRI4d8FOe1BIXLispheXcGaxnnsIHU/+hnoVoiI7/H8r0bsdIAK6Q4BibpmGVv7r8CKw+HJIJ3NQVdk+RGWVY862RTPFUJWfYmtr0QdiAvPpimRlPahB54Y1ramzXZHI6DxsP7eClw=





**H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.  
ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO  
EJERCICIO 2019**

**FECHA DE ELABORACION:**  
08/07/2019  
**MES QUE SE REPORTA**  
JUNIO

**DATOS GENERALES**

**MUNICIPIO:** CHOCAMAN **LOCALIDAD:** TETLA  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** FSM-DE 2016 (SENTENCIA) **No. DE OBRA:** 2019300620208 **DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOC. TETLA

**CUENTA CON PROYECTO EJECUTIVO:** SI  NO  **ANTECEDENTES:** SI  NO

**TIPO DE OBRAS REALIZADAS CON FSM-DF:** CLAVE N/A **GRADO DE REZAGO SOCIAL:** NIJ AUTO ALTO MEDIO X BAJO **TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO:** DIRECTA X INDIRECTA COMPLEMENTARIA

**ZONA:** RURAL X URBANA **AGEB:** SI  NO  **SE ENCUENTRA EN UNA ZAP:** SI  NO  **PROYECTO ESPECIAL:** SI  NO

**COORDENADAS DE GEOREFERENCIA** LONGITUD 0.000000000 **CUENTA CON OPIÓN FAVORABLE** SI  NO

**ESTADO FINANCIERO DE OBRA\***

No. EST.	MONTO	POLIZAS CHEQUE		No.	IMPORTE OBRA EST.	AMONTIZADO	FACTURAS		IMPORTE DEVENGADO
		No.	MONTO				5 MILLAR	CARGOS ADICIONALES	
1	\$207,898.82	190600C	\$207,898.82	00E0C08800C	\$207,898.82	\$0.00	\$896.12	\$0.00	\$207,002.70
<b>TOTALES</b>	<b>\$207,898.82</b>		<b>\$207,898.82</b>		<b>\$207,898.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$896.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$207,002.70</b>

**AVANCE FISICO REAL**

AVANCE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REAL	0	0	0	0	0	40.14	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	40.14	0	0	0	0	0	0
ATRASO (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**REPORTE**

	EXISTE	FECHAS
MONTO PAGADO EN EL MES:	\$207,898.82	26/06/2019
MONTO PAGADO ACUMULADO:	\$207,898.82	26/06/2019
FINIQUITO:	\$0.00	
ACTA ENTREGA RECEPCION:		

OBSERVACIONES:

LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE DEL 40.14% Y SE ENCUENTRA EN PROCESO

En caso de requerir más flujo en el apartado de estado financiero utilizar esta tabla.

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL OBJETO (META) DE LA OBRA:** REHABILITACIÓN DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOC. TETLA

**REHABILITACIÓN DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOC. TETLA**

**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN EL MES:** 40.14% de avance físico

**MONTO AUTORIZADO:** \$517,861.54 **C/N/A**

**MONTO DEL PRESUPUESTO BASE:** \$517,861.54 **C/N/A**

**VALIDACIÓN DEL PROYECTO:** EXISTE  NO EXISTE  **NO APLICA** X

**DEPENDENCIA QUE VALIDA:** EXISTE  NO EXISTE  **NO APLICA** X

**FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:** EXISTE  NO EXISTE  **NO APLICA** X

**DEPENDENCIA QUE OTORGA LA FACTIBILIDAD:** EXISTE  NO EXISTE  **NO APLICA** X

**TIPO DE LICITACIÓN:** ADJUDICACIÓN DIRECTA INVITACIÓN A MENOS 3 PERSONAS LICITACIÓN PÚBLICA **EXISTE** X

**NO. DE CONTRATO:** 2019300620208.00 **FECHA:** 03/06/2019

**CONTRATISTA:** EVARISTO COLORADO NEXTE **REAL** C/N/A

**MONTO CONTRATADO:** \$517,861.54 **PROGRAMADA** C/N/A

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** INICIO 03/06/2019 **REAL** 03/06/2019

TERMINO 03/09/2019 **C/N/A** 03/09/2019

DÍAS 92 **NO APLICA** 92

**ANTICIPO:** APLICA  NO APLICA  **PORCENTAJE:** X

FECHA DE PAGO: **NO APLICA** **NO APLICA**

**TIPO DE FINANZA:** ANTI-CIPO

**MONTO AFINANZADO:** \$44,643.23 **CUMPLIMIENTO** VIGOS OCULTOS

**NO. DE FINANZAS:** 2329218 **SOMER** 03/06/2019

**FECHA:** 03/06/2019 **IMPORTE/PERIODO** FECHA

**CONVENIO MODIFICADO:** EXISTE  NO APLICA

**PLAZO:** INICIAL FINAL


**MONTO:** INICIAL FINAL

**NO APLICA** **\$517,861.54** **C/N/A**

**ARQ. LUIS ALBERTO HUERTIA CABRERA**  
SUPERVISOR

**OPORTUNAS PUBLICAS**  
CHOCAMAN  
2019.8.2021

FORMATO 11




H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMÁN, VER.

FORMATO 09

REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA (HORIZONTAL)

DATOS GENERALES

Municipio: CHOCAMÁN Localidad: TETLA  
 No. de obra: 2019300620208 Período: JUNIO  
 Descripción: REHABILITACIÓN DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOC. TETLA  
 Ejercicio fiscal: EJERCICIO 2019  
 Número de estimación: 1  
 Fuente de financiamiento: FISM-DF 2016 (SENTENCIA)  
 Fecha de revisión: 09/07/2019

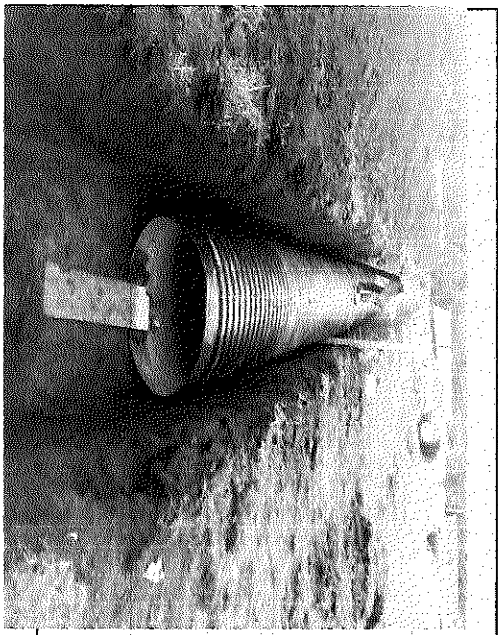

FOTO

Concepto de obra ejecutado: Suministro y colocación de tubería ADS de 36 pulgadas de diámetro (91cms). Incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra



FOTO

Concepto de obra ejecutado: Excavación a mano en cepas de terreno tipo II-A de 0.00mts 1.50mts de profundidad, con herramienta manual, sin considerar acarreo

OBSERVACIONES:

Observaciones:



LUIS ALBERTO HUERTA CABRERA  
ARQUITECTO  
Supervisor responsable

CD. Tesorero Municipal  
CD. Contralor Interno  
CD. Presidente Municipal

OPRAS  
OBRAS PUBLICAS

CHOCAMÁN  
2018-2021
