



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

En el Municipio de Chocamán, Ver., siendo las 09:00 horas. Del Día 30 del mes de Julio de 2016 reunidos los representantes del,

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN VER.

C. Ing. Raymundo Nolasco Villa; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon;** Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda;** Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.

Nombre o razón social: HUATUSCO CONSTRUYE S. DE R.L. DE C.V.

Domicilio: CALLE 6 NORTE 317, COL. CENTRO, HUATUSCO, VER.

RFC: HCO101118KC0

Representante Legal: ING. JOSÉ ALBERTO CONTRERAS RODRIGUEZ.

Con el objeto de efectuar el acto de **ENTREGA-RECEPCION** de la obra:

"REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CALAQUIOCO."

DATOS DE LA OBRA:

Fondo: No. De Obra: **2016300620015** No. De Contrato: **FIS MDF/2016/0015** Modalidad de contratación:

Adjudicación directa () Invitación a tres contratistas (x) Licitación Pública ()


Monto del contrato: **\$1, 258,015.94**

Fecha de Inicio: **30 MAYO 2016**

Fecha de Término: **30 JULIO 2016**

INVERSION:

INVERSION APROBADA			INVERSION APLICADA		
FIS MDF	COMUNIDAD	TOTAL	FIS MDF	COMUNIDAD	TOTAL
\$1, 258,015.94	0.00	\$1, 258,015.94	\$1, 258,015.94	0.00	\$1, 258,015.94



Benito Napoleón Velasco



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Descripción	Unidad
"REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CALAQUIOCO."	
PRELIMINARES	
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS EN TERRENO PLANO DE 1000 A 2000 M2	
DEMOLICION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 8CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE APLILE	
DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE 15*20*40 CM CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE APILE	
DEMOLICION DE CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 18 CMS DE ESPESOR EN RODAMIENTO CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE APILE	
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y LOSAS DE CONCRETO EN CAMION DE VOLTEO DE 6.0 M3 DE CAPACIDAD TIRO LIBRE; INCLUYE: CARGA POR MEDIOS MANUALES	M3
CORTE EN CAJA, CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL TIPO II, PARA ALCANZAR NIVEL DE PROYECTO. ZONA C,	M3
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN CAJA, EN CAMION DE VOLTEO DE 6.0 M3 DE CAPACIDAD TIRO LIBRE; INCLUYE: CARGA POR MEDIOS MECANICOS	M3
CONFORMACIÓN Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE AL 95% PVS M CON EQUIPO MECANICO	M2
DEMOLICIÓN DE PIEDRA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA
GUARNICIONES	
EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO II, EN FORMA MANUAL PARA RECIBIR GUARNICION, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO	M3
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO DE 6.0 M3 DE CAPACIDAD TIRO LIBRE; INCLUYE: CARGA POR MEDIOS MECANICOS.	M3
GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", REVENIMIENTO DE 10 - 12 CM, DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15*20*40 CM, CIMBRA METÁLICA 10 USOS. INCLUYE; CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y-DESCIMBRADO	ML
CONTRAGUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", REVENIMIENTO DE 10 - 12 CM, DE SECCION TRAPEZOIDAL 15*20*40 CM, CIMBRA METALICA 10 USOS. INCLUYE;	ML

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
CHOCAMÁN, VER
2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OBRAS PUBLICAS
CHOCAMÁN, VER
2014-2017

Bernardo Hernández Pineda



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION


	CIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO, EN RESPALDO DE BANQUETA.	
	PINTURA EN GUARNICIONES, CON ESMALTE AMARILLO (2 MANOS); INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	
BANQUETAS		
	PREPARACION DE LA SUPERFICIE, INCLUYE CORTE, Y/O TERRAPLEN, Y COMPACTACION.	M2
	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO ESCOBILLADO CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRADO Y VIBRADO.	
PAVIMENTO HIDRAULICO		
	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 25 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 100% , CON MATERIAL ARENO - GRAVOSO DEL BOQUERÓN.	
	PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, F'C = 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO RAYADO, CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS., INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA LISA DE 3/4" Ø, (REDONDO) DE 40 CM DE LONGITUD A/C 30 CM. DE SEPARACION , EN PASAJUNTAS DE CONSTRUCCION TRANSVERSALES	ML
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE AMARRE CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 60 CM DE LONGITUD A/C 1.00 M DE SEPARACION, COLOCADA TRANSVERSALMENTE A LO LARGO DE LA JUNTA LONGITUDINAL	ML
	CORTE DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE DE 6.35 CM. DE ESPESOR	ML
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO DE JUNTAS CON EMULSION SUPER ESTABLE	ML
	FABRICACIÓN DE TOPE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DIMENSIONES DE 0.80 M. DE ANCHO Y 7 CM. DE PERALTE LUZ Y 18 AHOGADOS DANDO UN TOTAL DE 25 CM, UBICADOS EN CADENAMIENTOS SEGÚN PROYECTOS.	ML
	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2
	Subtotal de Presupuesto	\$1, 084,496.50
	Impuesto	\$173,519.44
	Total	\$1, 258,015.94



RESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017



SINDICATURA
M2
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017



OBRAS
PUBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2014-2017

Derivado de la obra de...



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

El H. Ayuntamiento designa a: **C. Ing. Raymundo Nolasco Villa**; Director de Obras Públicas y **C. Arq. José Rafael Serrano Caramon**; Supervisor de Obras Interno, y **C. Ing. José Artemio Flores Grajeda**; Supervisor de Obra Externo. Y la empresa contratista a quien se le adjudicó el contrato.



Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron, se asienta lo siguiente:

Estando de acuerdo en lo manifestado se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y acta para su operación, por lo que está en condiciones de ser recibida por el Consejo de Desarrollo Municipal quien se compromete a implementar un programa de conservación y mantenimiento de la misma.

El acto de entrega recepción de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 horas del día citado,


Levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervino en ella. Damos fe

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA

ARQ. JOSE RAFAEL SERRANO CARAMON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA



OBRAS PUBLICAS CHOCAMÁN, VER 2014-2017

EL COMITÉ COMUNITARIO:

Presidente: Bernardo Napoleón Delgado Suplente: Berwick

Secretario: Miguel Cruz Suplente: [Signature]

Vocal: Roman Espinoza Vallejos Suplente: [Signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

El acto de **ENTREGA-RECEPCION** de los trabajos realizados no libera al contratista por las responsabilidades de obra faltante, mal ejecutado, mala calidad de los materiales utilizados, pagos indebidos o vicios ocultos, por lo que el H. Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar pertinentemente las reclamaciones que a derecho correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluido el acto, siendo las 11:00 hrs. del día citado, levantando para constancia de este acuerdo la presente acta, donde firman quienes intervinieron en él.

Damos fé

Por el H. Ayuntamiento:

ENTREGA

PRESIDENTE MPAL

SINDICO UNICO

L. Q. C. Lucio Alejandro Rojas Ramírez

C. Octavio Hernández Alejo.

TESORERO

SECRETARIO

C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández.

Lic. Carolina Marlene González De Aquino.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

L.E.P. Maricel Cabrera Rivera



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature: Bernardo Marjeth Delgado



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VERACRUZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

Y Por el Comité Comunitario:

RECIBEN


Presidente: Bernardo Napoleón Delgado Suplente: De la H.

Secretario: Miguel Cruz Suplente: [Signature]

Vocal : Romas Espinosa Velasco Suplente: [Signature]



[Signature]

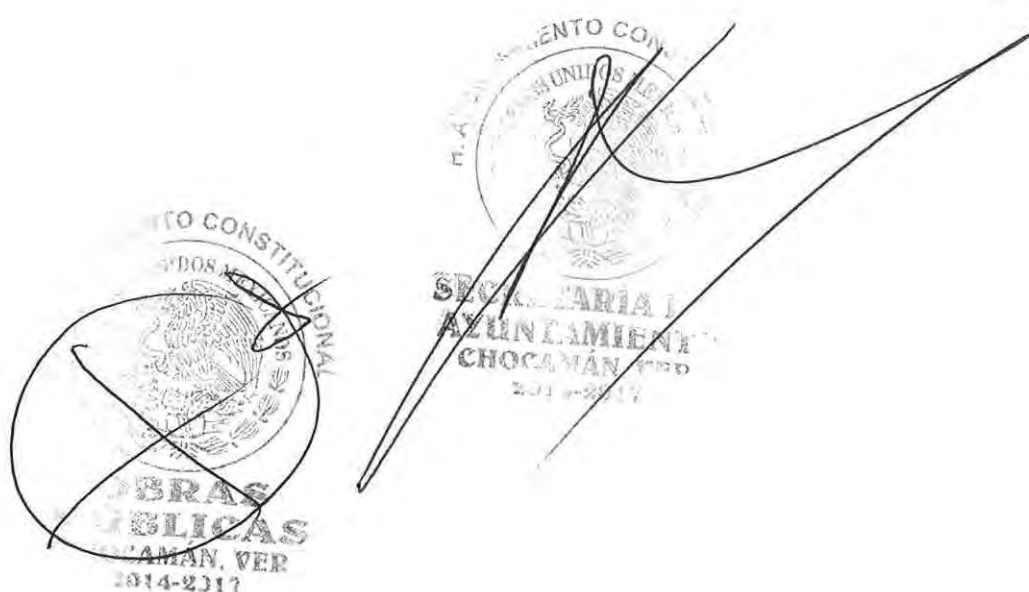

[Signature]
